

INSTINCT by MACO

ABNAHME-CHECKLISTE

Auftragsdaten

Türhersteller: _____

Auftragsnummer: _____

Kommission / Kunde: _____

Bestelldatum: _____

Produktionsdatum: _____

Verbaute Elektronikkomponenten

Netzteil & USV


5 0 9 4 0 0 Unterputz-Netzteil 230V/50Hz

Seriennummer: _____ - _____




5 0 9 4 0 1 Hutschiene-Netzteil 230V/50Hz

Seriennummer: _____ - _____



5 0 9 4 1 0 USV-Modul

Seriennummer: _____ - _____

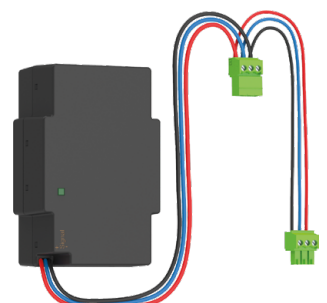

INSTINCT by MACO

ABNAHME-CHECKLISTE

Gateway


5 0 9 3 0 0 Gateway

Seriennummer: 121749 - _____



5 0 9 3 0 1 Gateway mit Akustik-Modul

Seriennummer: 121749 - _____



Zutrittskontrolle & Zubehör

5 0 9 3 1 0 INSTINCT Interface

Seriennummer: 120368 - _____



5 0 9 3 2 0 INSTINCT Bluetooth-Modul

Seriennummer: 120370 - _____



INSTINCT by MACO

ABNAHME-CHECKLISTE

Verschlussystem

5 **0** **1** **1** INSTINCT Guard

- Verschluss 1: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 2: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 3: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 4: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 5: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 6: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 7: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 8: Seriennummer: _____ - _____



5 **0** **1** **2** INSTINCT Guard+

- Verschluss 1: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 2: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 3: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 4: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 5: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 6: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 7: Seriennummer: _____ - _____
- Verschluss 8: Seriennummer: _____ - _____



INSTINCT by MACO

ABNAHME-CHECKLISTE

Funktionskontrolle vor Auslieferung

Funktion		Prüfung in Ordnung	Prüfung nicht in Ordnung	Prüfung nicht möglich	Funktion nicht vorgesehen
1	Keine optischen Beschädigungen an Verschlüssen und Schließteilen				
2	Ordnungsgemäße Entriegelung bei manueller Betätigung der Verriegelungshaken*				
3	Ordnungsgemäße Einstellung der Schließteile*				
4	Ordnungsgemäße Verriegelung beim Schließen der Tür*				
5	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-Test-Kit*				
6	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-App im Baustellenmodus				
7	Ordnungsgemäße Entriegelung über Fingerscan, Keypad o.ä.				
8	Ordnungsgemäße Entriegelung über vorgesehene Ansteuerung von innen				
9	Ordnungsgemäße Entriegelung über Smart-Home-System				
10	Ordnungsgemäße Funktion der akustischen Signalisierung*				
11	Ordnungsgemäße Funktion der motorischen Tagesentriegelung*				
12	Ordnungsgemäße Funktion der elektronischen Verschlussüberwachung				
13	Ordnungsgemäße Funktion in Kombination mit Drehtürantrieb				

*Details zur Durchführung dieser Prüfschritte entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Zusatzbemerkungen zu Punkt:

Auslieferungszustand	Zubehör (Admin Card, Gateway, Netzteil & USV-Modul)	Begleitdokumentation (Bedienungs- und Wartungsanleitung, Gebrauchshinweise, Dokumentation der Verriegelungspositionen)
<input type="checkbox"/> in Tagesentriegelung (von MACO empfohlen)	<input type="checkbox"/> ordnungsgemäß verpackt und beigelegt	<input type="checkbox"/> ordnungsgemäß verpackt und beigelegt
<input type="checkbox"/> verriegelt	<input type="checkbox"/> wird separat versendet	<input type="checkbox"/> wird separat versendet
<input type="checkbox"/> Türrahmen & Türflügel separat (nur in Tagesentriegelung zulässig)		

Hiermit bestätigt der Monteur die ordnungsgemäße Ausführung und uneingeschränkte Funktion der Tür vor Auslieferung:

Ort & Datum

Unterschrift / Monteur

INSTINCT by MACO

ABNAHME-CHECKLISTE

Übergabeprotokoll

Funktion		Prüfung in Ordnung	Prüfung nicht in Ordnung	Prüfung nicht möglich	Funktion nicht vorgesehen
1	Keine optischen Beschädigungen an Verschlüssen und Schließteilen				
2	Ordnungsgemäße Entriegelung bei manueller Betätigung der Verriegelungshaken*				
3	Ordnungsgemäße Einstellung der Schließteile*				
4	Ordnungsgemäße Verriegelung beim Schließen der Tür*				
5	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-Test-Kit*				
6	Ordnungsgemäße Entriegelung über INSTINCT-App im Baustellenmodus				
7	Ordnungsgemäße Entriegelung über Fingerscan, Keypad o.ä.				
8	Ordnungsgemäße Entriegelung über vorgesehene Ansteuerung von innen				
9	Ordnungsgemäße Entriegelung über Smart-Home-System				
10	Ordnungsgemäße Funktion der akustischen Signalisierung*				
11	Ordnungsgemäße Funktion der motorischen Tagesentriegelung*				
12	Ordnungsgemäße Funktion der elektronischen Verschlussüberwachung				
13	Ordnungsgemäße Funktion in Kombination mit Drehtürantrieb				

*Details zur Durchführung dieser Prüfschritte entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Zusatzbemerkungen zu Punkt:

Admin Card

- übergeben
- nicht übergeben
- kein Bluetooth-Modul vorgesehen

Begleitdokumentation

(Bedienungs- und Wartungsanleitung, Gebrauchshinweise, Dokumentation der Verriegelungspositionen)

- übergeben
- nicht übergeben

Hiermit bestätigen Auftraggeber und Monteur die ordnungsgemäße Ausführung und Funktion der Tür nach dem Einbau:

Ort & Datum

Unterschrift / Monteur

Unterschrift / Kunde
